



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
¡El poder de servir!

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 087 TEMOAYA / FAISMUN
Año de Ejercicio 2023. AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 107,728,588.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
66578/ 0001 160584	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	196 PAVIMENT ACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES / JIQUIPILCO EL VIEJO 3º SECCION (TIERRA BLANCA)	ADMINIST RACION	2023-05-18	2023-07-17	800,000.00	800,000.00	0.00	716,592.52	716,592.52	0.00	02 METRO C UADRAD O	1,045.00		3 POBLAD O	1	120	90	89.57
66579/ 0002 161272	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	196 PAVIMENT ACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA CUAUHTÉMOC / SAN PEDRO ABAJO 1º SECCION	ADMINIST RACION	2023-09-04	2023-11-30	700,000.00	700,000.00	0.00	542,547.05	542,547.05	0.00	02 METRO C UADRAD O	1,000.00		3 POBLAD O	1	180	78	77.51
66580/ 0003 161341	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	196 PAVIMENT ACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AVENIDA REFORMA, RUMBO A LA PREPARATORIA EN EL PARAJE TEXCOAY Y BASE DE TAXIS / SAN PEDRO ARRIBA 2º SECCION	ADMINIST RACION	2023-09-11	2023-11-09	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	1,078,460.87	1,078,460.87	0.00	02 METRO C UADRAD O	1,764.88		3 POBLAD O	1	180	83	82.96
66582/ 0004 161379	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	196 PAVIMENT ACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO / SAN PEDRO ARRIBA 3º SECCION	ADMINIST RACION	2023-07-05	2023-08-31	800,000.00	800,000.00	0.00	708,859.18	708,859.18	0.00	02 METRO C UADRAD O	1,054.00		3 POBLAD O	1	150	88	88.62
66584/ 0005 161937	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	196 PAVIMENT ACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE REFORMA EN LA PARTE NORTE. / SAN PEDRO ARRIBA 5º SECCION	ADMINIST RACION	2023-07-05	2023-08-31	400,000.00	400,000.00	0.00	348,145.24	348,145.24	0.00	02 METRO C UADRAD O	578.00		3 POBLAD O	1	150	87	87.04
66586/ 0006 161967	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	196 PAVIMENT ACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 1RO DE MAYO / SAN DIEGO ALCALA 3a. SECCION	ADMINIST RACION	2023-05-30	2023-07-28	800,000.00	800,000.00	0.00	703,861.86	703,861.86	0.00	02 METRO C UADRAD O	1,183.00		3 POBLAD O	1	130	88	87.98
66588/ 0007 162382	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	196 PAVIMENT ACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DE LOS LIMITES CON LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ PATHE / SAN DIEGO ALCALA 5TA. SECCIÓN (SILVERIO GALICIA GA	ADMINIST RACION	2023-05-30	2023-08-30	200,000.00	200,000.00	0.00	154,417.20	154,417.20	0.00	02 METRO C UADRAD O	231.00		3 POBLAD O	1	90	77	77.21
66589/ 0008 162692	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	196 PAVIMENT ACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AVENIDA DE LOS MAESTROS / SAN DIEGO ALCALA 5TA. SECCIÓN (SILVERIO GALICIA GA	CONTRAT O	2023-05-30	2023-07-28	800,000.00	800,000.00	0.00	703,901.52	703,901.52	0.00	02 METRO C UADRAD O	1,177.00		3 POBLAD O	1	130	88	87.99
66591/ 0009 162975	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	196 PAVIMENT ACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LOS IGLESIAS / EJIDO DE ALLENDE	CONTRAT O	2023-05-30	2023-06-30	600,000.00	600,000.00	0.00	519,653.57	519,653.57	0.00	02 METRO C UADRAD O			3 POBLAD O	1	75	86	86.61
66592/ 0010 160815	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	196 PAVIMENT ACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE VENUSTIANO GARRANZA. / EJIDO DE DOLORES	ADMINIST RACION	2023-09-04	2023-10-31	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	873,515.19	873,515.19	0.00	02 METRO C UADRAD O	1,402.00		3 POBLAD O	1	150	87	87.35
66593/ 0011 163301	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	196 PAVIMENT ACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CONSTITUCIÓN / LAUREL 2º SECCION	ADMINIST RACION	2023-05-18	2023-07-17	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	835,256.77	835,256.77	0.00	02 METRO C UADRAD O	1,488.00		3 POBLAD O	1	110	83	83.53

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

22 ENE 2024

UNIDAD DE NORMATIVIDAD

RECIBIDO

RECIBO: 3

HORA: 1


EDOMEX

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

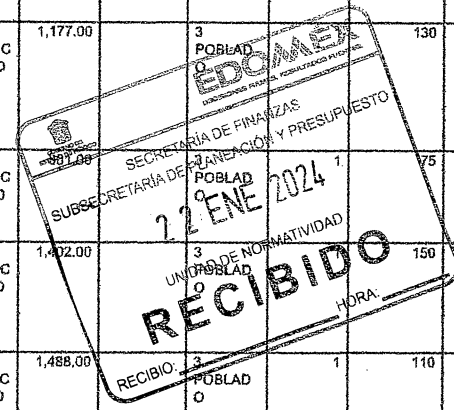

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 087 TEMOAYA / FAISMUN
Año de Ejercicio 2023. AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 107,728,588.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Elec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
66595/ 0012 163360	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRU CION COMPLEMEN TARIOS	196 PAVIMENT ACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LIBRAMIENTO. / TLALTENANGUITO	ADMINIST RACION	2023-05-30	2023-07-28	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	753,575.39	753,575.39	0.00	02 METRO C UADRAD O	1,350.00		3 POBLAD O	1	150	75	75.36
66596/ 0013 163422	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRU CION COMPLEMEN TARIOS	196 PAVIMENT ACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE NUEVA BRECHA NORTE. / ENTHAVI 2ª SECCION	ADMINIST RACION	2023-05-18	2023-07-17	800,000.00	800,000.00	0.00	708,021.56	708,021.56	0.00	02 METRO C UADRAD O	1,047.00		3 POBLAD O	1	130	88	88.50
66597/ 0014 163563	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRU CION COMPLEMEN TARIOS	196 PAVIMENT ACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE TULCUEZPALIN. / JQUIPILCO EL VIEJO CENTRO	ADMINIST RACION	2023-05-30	2023-06-30	500,000.00	500,000.00	0.00	440,455.01	440,455.01	0.00	02 METRO C UADRAD O	588.00		3 POBLAD O	1	250	88	88.09
66598/ 0015 165933	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRU CION COMPLEMEN TARIOS	196 PAVIMENT ACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES. / JQUIPILCO EL VIEJO 1ª SECCION	CONTRAT O	2023-05-18	2023-07-17	700,000.00	700,000.00	0.00	619,085.51	619,085.51	0.00	02 METRO C UADRAD O	861.00		3 POBLAD O	1	165	89	88.44
66600/ 0016 165956	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRU CION COMPLEMEN TARIOS	196 PAVIMENT ACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES / JQUIPILCO EL VIEJO 2ª SECCION	ADMINIST RACION	2023-05-18	2023-07-17	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	901,349.90	901,349.90	0.00	02 METRO C UADRAD O	1,292.00		3 POBLAD O	1	165	90	90.14
66601/ 0017 165998	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRU CION COMPLEMEN TARIOS	196 PAVIMENT ACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LA VENTA. / MAGDALENA TENEXPAN 1ª Y 2ª SECCION	ADMINIST RACION	2023-05-30	2023-07-28	900,000.00	900,000.00	0.00	814,035.62	814,035.62	0.00	02 METRO C UADRAD O	1,329.00		3 POBLAD O	1	130	90	90.45
66602/ 0018 160961	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRU CION COMPLEMEN TARIOS	196 PAVIMENT ACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALZADA SAN LORENZO / SAN LORENZO OYAMEL 1a. SECCION	ADMINIST RACION	2023-09-11	2023-11-15	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,091,810.91	1,091,810.91	0.00	02 METRO C UADRAD O	1,642.00		3 POBLAD O	1	190	72	72.79
66603/ 0019 165976	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRU CION COMPLEMEN TARIOS	196 PAVIMENT ACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO REAL DEL ORO Y CALLE PROLONGACIÓN ÁRBOL EL NARANJO. / SAN LORENZO OYAMEL 2a. SECCION	ADMINIST RACION	2023-05-30	2023-07-28	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	900,305.76	900,305.76	0.00	02 METRO C UADRAD O	1,475.00		3 POBLAD O	1	150	90	90.03
66606/ 0020 165991	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRU CION COMPLEMEN TARIOS	196 PAVIMENT ACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LIQUIDAMBAR. / SAN LORENZO OYAMEL 3a. SECCION	ADMINIST RACION	2023-05-30	2023-07-28	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	106,225.20	106,225.20	0.00	02 METRO C UADRAD O	1,475.00		3 POBLAD O	1	150	10	10.62
66607/ 0021 166031	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRU CION COMPLEMEN TARIOS	196 PAVIMENT ACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE NUEVA PARAJE LOMA LARGA. / SAN PEDRO ABAJO 2ª SECCION	ADMINIST RACION	2023-05-18	2023-06-29	550,000.00	550,000.00	0.00	487,152.76	487,152.76	0.00	02 METRO C UADRAD O	640.00		3 POBLAD O	1	100	89	88.57
66608/ 0022 166041	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRU CION COMPLEMEN TARIOS	196 PAVIMENT ACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE. / SAN PEDRO ABAJO 2ª SECCION	ADMINIST RACION	2023-05-18	2023-06-16	250,000.00	250,000.00	0.00	223,325.52	223,325.52	0.00	02 METRO C UADRAD O	341.00		3 POBLAD O	1	100	89	89.32
66609/ 0023 166048	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRU CION COMPLEMEN TARIOS	196 PAVIMENT ACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN PARAJE LOS FILOMENOS Y OYAMEL / SAN PEDRO ARRIBA 4ª SECCION	ADMINIST RACION	2023-05-30	2023-07-28	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	990.00		3 POBLAD O	1	110	0	0.00



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO




ESTADO DE
MÉXICO
¡El poder de servir!

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 087 TEMOAYA / FAISMUN
Año de Ejercicio 2023. AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 107,728,588.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
66610/ 0024 161043	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	196 PAVIMENT ACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO FEDERAL MIGUEL DE LA MADRID HURTADO. / SAN DIEGO ALCALA 2a. SECCION (CENTRO)	ADMINIST RACION	2023-08-14	2023-09-23	570,000.00	570,000.00	0.00	504,001.69	504,001.69	0.00	02 METRO C UADRAD O	886.00		3 POBLAD O	1	170	88	88.42
66613/ 0025 166050	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	196 PAVIMENT ACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE JOSÉ VICENTE VILLADA. / LLANO DE LA Y	ADMINIST RACION	2023-07-05	2023-08-31	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	886,854.28	886,854.28	0.00	02 METRO C UADRAD O	1,496.00		3 POBLAD O	1	150	88	88.69
66615/ 0026 166907	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	196 PAVIMENT ACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DE LOS TAXIS Y CALLE DE LA CAPILLA. / LOMA DEL PROGRESO	ADMINIST RACION	2023-07-05	2023-08-31	800,000.00	800,000.00	0.00	716,229.13	716,229.13	0.00	02 METRO C UADRAD O	1,280.00		3 POBLAD O	1	150	89	89.54
66616/ 0027 166967	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	196 PAVIMENT ACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL Y CALLE LOMA OLVIDADA. / RANCHERIA DE LOMAS	ADMINIST RACION	2023-07-21	2023-09-19	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	915,825.63	915,825.63	0.00	02 METRO C UADRAD O	1,839.00		3 POBLAD O	1	150	83	83.26
66620/ 0028 167018	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	196 PAVIMENT ACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DEL GAS Y CALLE PRINCIPAL AL CENTRO DE SALUD. / SAN JOSE LAS LOMAS	ADMINIST RACION	2023-07-21	2023-09-19	800,000.00	800,000.00	0.00	684,418.72	684,418.72	0.00	02 METRO C UADRAD O	1,312.00		3 POBLAD O	1	150	86	85.55
66623/ 0029 167065	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	196 PAVIMENT ACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE A LA CAPILLA. / COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	ADMINIST RACION	2023-07-21	2023-09-19	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	1,021,115.04	1,021,115.04	0.00	02 METRO C UADRAD O	1,572.00		3 POBLAD O	1	110	93	92.83
66624/ 0030 167203	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	196 PAVIMENT ACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL FEDERAL. / COLONIA EMILIANO ZAPATA	ADMINIST RACION	2023-07-21	2023-09-22	300,000.00	300,000.00	0.00	265,590.43	265,590.43	0.00	02 METRO C UADRAD O	502.00		3 POBLAD O	1	150	88	88.53
66625/ 0031 167224	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	196 PAVIMENT ACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ÁLVARO OBREGÓN. / EJIDO DE MIMBRES	ADMINIST RACION	2023-07-05	2023-08-31	900,000.00	900,000.00	0.00	771,275.07	771,275.07	0.00	02 METRO C UADRAD O	1,245.00		3 POBLAD O	1	150	86	85.70
66626/ 0032 167244	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	196 PAVIMENT ACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE QUE VA RUMBO A LA LOMA. / SAN JOSE PATHE	ADMINIST RACION	2023-05-30	2023-06-30	500,000.00	500,000.00	0.00	436,402.84	436,402.84	0.00	02 METRO C UADRAD O	729.00		3 POBLAD O	120	87	87	87.28
66627/ 0033 235704	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	196 PAVIMENT ACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CERCA DEL RIO. / SAN JOSE PATHE	ADMINIST RACION	2023-08-14	2023-09-13	360,000.00	360,000.00	0.00	314,362.04	314,362.04	0.00	02 METRO C UADRAD O	540.00		3 POBLAD O	150	87	87	87.32
66628/ 0034 167294	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	196 PAVIMENT ACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CIRCUITO CEDRO BLANCO Y CALLE OLMO. / SAN MATEO ALCALA	ADMINIST RACION	2023-07-21	2023-09-19	800,000.00	800,000.00	0.00	717,022.63	717,022.63	0.00	01 METRO LINEAL	1,270.00		3 POBLAD O	150	90	89	89.64
66629/ 0035 167359	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	196 PAVIMENT ACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN PARAJE LOS PINOS Y LAS MANZANAS. / LA CAÑADA	ADMINIST RACION	2023-07-21	2023-09-19	700,000.00	700,000.00	0.00	635,726.97	635,726.97	0.00	02 METRO C UADRAD O	968.00		3 POBLAD O	1	120	90	90.82

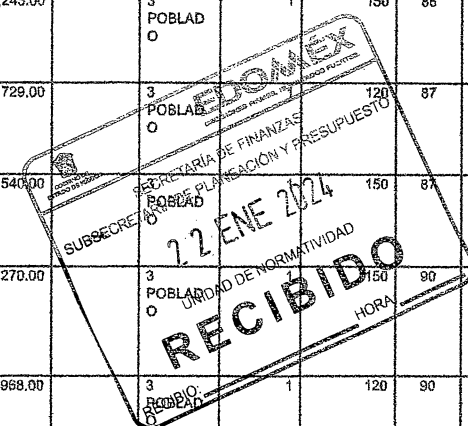



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
¡El poder de servir!

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 087 TEMOAYA / FAJSMUN
Año de Ejercicio 2023. AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 107,728,588.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
66630/ 0036 167388	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	196 PAVIMENT ACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LOMA DE LA PAZ. / LOMA ALTA	ADMINIST RACION	2023-07-21	2023-09-19	800,000.00	800,000.00	0.00	717,233.75	717,233.75	0.00	02 METRO C UADRAD O	1,088.00		3 POBLAD O	1	120	89	89.65
66631/ 0037 235854	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	196 PAVIMENT ACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 12 DE ABRIL, 5 DE MAYO, 21 DE MARZO Y 10 DE MAYO. / SOLALPAN 1ª SECCION	ADMINIST RACION	2023-09-04	2023-11-03	800,000.00	800,000.00	0.00	593,025.36	593,025.36	0.00	02 METRO C UADRAD O	1,021.00		3 POBLAD O	1	180	74	74.13
66632/ 0038 236278	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	196 PAVIMENT ACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIFERENTES CALLES / TLATENANGO ARRIBA	ADMINIST RACION	2023-08-14	2023-09-18	350,000.00	350,000.00	0.00	262,387.96	262,387.96	0.00	02 METRO C UADRAD O	460.00		3 POBLAD O	1	180	75	74.97
66633/ 0039 236581	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	196 PAVIMENT ACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL PARAJE LA JOYA Y PARAJE LA LADERA. / BARRIO DE LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA	ADMINIST RACION	2023-08-14	2023-10-14	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	841,868.61	841,868.61	0.00	02 METRO C UADRAD O	1,210.00		3 POBLAD O	1	180	76	76.53
66634/ 0040 167400	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	196 PAVIMENT ACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS, PARAJE SAN LUCAS. / SAN JOSE LAS LOMAS	ADMINIST RACION	2023-07-21	2023-09-19	600,000.00	600,000.00	0.00	531,919.24	531,919.24	0.00	02 METRO C UADRAD O	1,020.00		3 POBLAD O	1	150	89	88.65
66635/ 0041 237310	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	196 PAVIMENT ACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ESTADO DE VERACRUZ Y ESTADO DE SINALOA. / RANCHERIA DE TROJES	ADMINIST RACION	2023-09-04	2023-10-31	620,000.00	620,000.00	0.00	467,723.97	467,723.97	0.00	02 METRO C UADRAD O	861.00		3 POBLAD O	1	150	75	75.44
66636/ 0042 237530	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	196 PAVIMENT ACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE NICOLÁS BRAVO. / MAGDALENA TENEXPAN 3ª Y 4ª SECCION	ADMINIST RACION	2023-09-11	2023-11-15	300,000.00	300,000.00	0.00	260,383.12	260,383.12	0.00	02 METRO C UADRAD O	396.00		3 POBLAD O	1	180	86	86.79
66637/ 0043 168251	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	196 PAVIMENT ACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ESTADO DE MÉXICO. / SAN JOSE BUENAVISTA EL GRANDE	ADMINIST RACION	2023-07-21	2023-09-19	600,000.00	600,000.00	0.00	436,443.42	436,443.42	0.00	02 METRO C UADRAD O	845.00		3 POBLAD O	1	150	73	72.74
66638/ 0044 238438	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	196 PAVIMENT ACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CHIMALPOPOCA. / MOLINO ARRIBA	ADMINIST RACION	2023-09-04	2023-11-03	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	1,543,066.12	1,543,066.12	0.00	02 METRO C UADRAD O	1,803.00		3 POBLAD O	200	77	77.15	
66639/ 0045 168348	17 URB	UR URBANIZACIO N	C REHABILIT ACION COMPLEMEN TARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	REHABILITACIÓN DE ANDADOR URBANO Y ESCALINATA. / CABACERA MUNICIPAL DE TEMOAYA	CONTRAT O	2023-06-12	2023-07-28	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	999,842.65	999,842.65	0.00	01 METRO LINEAL	80.00		3 POBLAD O	300	99	99.98	
66640/ 0046 238555	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	186 GUARNICIONE S Y BANQUETAS	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE PRINCIPAL IGNACIO ALLENDE. / ENTHAVI 2ª SECCION	ADMINIST RACION	2023-08-14	2023-09-15	400,000.00	400,000.00	0.00	255,635.55	255,635.55	0.00	01 METRO LINEAL	392.00		3 POBLAD O	785	63	63.91	
66641/ 0047 238626	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	186 GUARNICIONE S Y BANQUETAS	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA AVENIDA SAN LORENZO. / MAGDALENA TENEXPAN 1ª Y 2ª SECCION	ADMINIST RACION	2023-09-04	2023-11-03	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	249.00		3 POBLAD O	102	0	0.00	





GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO




ESTADO DE
MÉXICO
¡El poder de servir!

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 087 TEMOAYA / FAISMUN
Año de Ejercicio 2023. AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 107,728,588.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses E.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
66642/ 0048 238649	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	186 GUARNICIONES Y BANQUETAS	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN VARIAS CALLES. / RANCHERIA DE TROJES	ADMINISTRACION	2023-08-09	2023-10-08	480,000.00	480,000.00	0.00	143,664.69	143,664.69	0.00	02 METRO CUADRA DO	340.00		3 POBLADO	1	750	30	29.93
66643/ 0049 242111	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	186 GUARNICIONES Y BANQUETAS	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN VARIAS CALLES. / TLALTENANGO ABAJO	CONTRATO	2023-06-26	2023-07-26	300,000.00	300,000.00	0.00	226,200.41	226,200.41	0.00	02 METRO CUADRA DO	260.00		3 POBLADO	1	150	75	75.40
66644/ 0050 168450	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	186 GUARNICIONES Y BANQUETAS	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN VARIAS CALLES. / TLALTENANGO ARRIBA	CONTRATO	2023-06-12	2023-07-12	400,000.00	400,000.00	0.00	342,116.88	342,116.88	0.00	02 METRO CUADRA DO	300.00		3 POBLADO	1	150	85	85.53
66651/ 0051 168771	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	186 GUARNICIONES Y BANQUETAS	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALZADA SIERRA CATEDRAL Y CAMINO A SOLALPAN. / ENTHAVI 3ª SECCION. (OJO DE AGUA)	ADMINISTRACION	2023-05-18	2023-07-17	300,000.00	300,000.00	0.00	251,106.47	251,106.47	0.00	01 METRO LINEAL	284.00		3 POBLADO	1	85	84	83.70
66652/ 0052 168848	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	186 GUARNICIONES Y BANQUETAS	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE 21 DE MARZO / SAN LORENZO OYAMEL 3a. SECCION	ADMINISTRACION	2023-07-05	2023-07-31	100,000.00	100,000.00	0.00	95,800.20	95,800.20	0.00	01 METRO LINEAL	108.00		3 POBLADO	1	85	95	95.80
66653/ 0053 240830	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	052 MUROS DE CONTENCION	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION PARA MAMPOSTERIA PARA RETRANQUE EN VIALIDAD. / JQUIPILCO EL VIEJO 1ª SECCION	CONTRATO	2023-07-31	2023-09-13	330,000.00	330,000.00	0.00	329,999.92	329,999.92	0.00	01 METRO LINEAL	11.00		3 POBLADO	1	400	99	100.00
66654/ 0054 240967	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO. / SAN PEDRO ARRIBA 3ª SECCION	CONTRATO	2023-07-21	2023-09-04	250,000.00	250,000.00	0.00	249,804.19	249,804.19	0.00	01 METRO LINEAL	165.00		3 POBLADO	1	150	99	99.92
66655/ 0055 241021	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CAMINO PRINCIPAL FEDERAL. / COLONIA EMILIANO ZAPATA	CONTRATO	2023-07-17	2023-08-28	750,000.00	750,000.00	0.00	749,442.61	749,442.61	0.00	01 METRO LINEAL	453.00		3 POBLADO	1	85	99	99.92
66657/ 0056 241112	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO A UN COSTADO DEL C2. / EJIDO DE DOLORES	CONTRATO	2023-06-12	2023-07-12	130,000.00	130,000.00	0.00	129,994.48	129,994.48	0.00	01 METRO LINEAL	45.00		3 POBLADO	1	150	99	99.99
66658/ 0057 241244	16 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES. / CERRITO DEL PANAL	ADMINISTRACION	2023-09-18	2023-11-15	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	926.00		3 POBLADO	1	150	0	0.00
66659/ 0058 241277	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRINCIPAL. / EJIDO DE TABORDA	ADMINISTRACION	2023-09-18	2023-10-23	350,000.00	350,000.00	0.00	192,760.38	192,760.38	0.00	01 METRO LINEAL	249.00		3 POBLADO	1	150	55	55.07
66660/ 0059 241324	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PARAJE LAS JARAS. / SAN JOSE LAS LOMAS	ADMINISTRACION	2023-09-18	2023-10-23	200,000.00	200,000.00	0.00	156,553.00	156,553.00	0.00	01 METRO LINEAL	192.00		3 POBLADO	1	150	78	78.28
66661/ 0060 241377	18 VIV	17 ELECTRIFI CACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFI CACION	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN VARIAS CALLES. / ENTHAVI 1ª SECCION	CONTRATO	2023-07-17	2023-08-31	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	796,352.15	796,352.15	0.00	17 PIEZA	9.00		3 POBLADO	1	48	79	79.64
66662/ 0061 241410	18 VIV	17 ELECTRIFI CACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFI CACION	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN PARAJE LA JOYA DE XOTHE. / SAN PEDRO ABAJO 2ª SECCION	CONTRATO	2023-07-17	2023-08-31	600,000.00	600,000.00	0.00	466,779.67	466,779.67	0.00	17 PIEZA	4.00		3 POBLADO	1	150	77	77.80

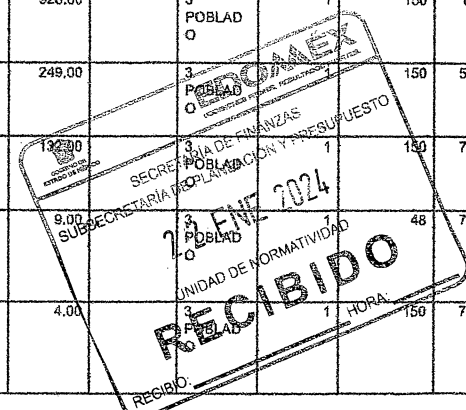

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 087 TEMOAYA / FAISMUN
Año de Ejercicio 2023. AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 107,728,588.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
66663/ 0062 241482	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION DIRECTA	011 ALUMBRADO PUBLICO	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PARAJE LOMA LARGA. / SAN PEDRO ABAJO 1ª SECCION	CONTRAT O	2023-07-31	2023-09-13	400,000.00	400,000.00	0.00	199,210.08	199,210.08	0.00	18 LUMINAR IA	13.00		3 POBLAD O	1	200	50	49.80
66666/ 0063 241544	17 URB	UR URBANIZACIO N	C REHABILITACION DIRECTA	011 ALUMBRADO PUBLICO	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES. / SAN JOSE BUENAVISTA EL GRANDE	CONTRAT O	2023-07-31	2023-09-13	500,000.00	500,000.00	0.00	498,080.24	498,080.24	0.00	18 LUMINAR IA	53.00		3 POBLAD O	1	550	99	99.62
66667/ 0064 241618	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	179 DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN PARAJE PUENTE ROTO. / SAN PEDRO ARRIBA 2ª SECCION	CONTRAT O	2023-07-17	2023-09-15	400,000.00	400,000.00	0.00	292,277.90	292,277.90	0.00	03 METRO CUBICO	78.00		3 POBLAD O	1	500	73	73.07
66673/ 0065 241672	15 AYS	AP AGUA POTABLE	Z MEJORAMIENTO DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA. / SOLALPAN 2ª SECCION	CONTRAT O	2023-06-12	2023-07-12	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	1,198,754.20	1,198,754.20	0.00	01 METRO LINEAL	2,930.00		3 POBLAD O	1	380	99	99.90
66674/ 0066 241731	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	281 CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO. / ENTHAVI 3ª SECCION, (OJO DE AGUA)	CONTRAT O	2023-06-26	2023-08-10	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	1,132,877.99	1,132,877.99	0.00	17 PIEZA	1.00		3 POBLAD O	1	500	94	94.40
66675/ 0067 241806	17 URB	UR URBANIZACIO N	B AMPLIACION COMPLEMENTARIOS	281 CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	AMPLIACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SEGUNDA ETAPA. / CABACERA MUNICIPAL DE TEMOAYA	CONTRAT O	2023-09-11	2023-11-11	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	999,982.16	999,982.16	0.00	02 METRO C UADRAD O	400.00		3 POBLAD O	1	1,500	100	100.00
66676/ 0068 241832	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ. / SAN ANTONIO DEL PUENTE	CONTRAT O	2023-08-09	2023-09-23	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	1,399,427.89	1,399,427.89	0.00	02 METRO C UADRAD O	510.00		5 ALUMNO	1	450	99	99.96
66677/ 0069 241861	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA NO. 1025 PROFESOR IDELFONSO VELÁZQUEZ. / SOLALPAN 1ª SECCION	CONTRAT O	2023-08-26	2023-08-10	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	1,249,514.79	1,249,514.79	0.00	02 METRO C UADRAD O	360.00		5 ALUMNO	1	200	99	99.96
66679/ 0070 241883	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	Z MEJORAMIENTO DIRECTA	208 PREPARATORIA (BARDAS PERIMETRALES)	MANTENIMIENTO DE BORDA PERIMETRAL EN ESCUELA PREPARATORIA. / SAN PEDRO ARRIBA 3ª SECCION	CONTRAT O	2023-07-17	2023-09-15	450,000.00	450,000.00	0.00	449,999.10	449,999.10	0.00	01 METRO LINEAL	135.00		5 ALUMNO	1	250	98	99.99
66681/ 0071 241989	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ESTADO DE OAXACA. / SAN JOSE BUENAVISTA EL GRANDE	ADMINISTRACION	2023-10-09	2023-10-23	100,000.00	100,000.00	0.00	6,200.20	6,200.20	0.00	02 METRO C UADRAD O	752.00		3 POBLAD O	1	90	6	6.20
67882/ 0072 352503	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FRANCISCO I. MADERO, BOBAXI Y NHUTJE / ENTHAVI 1ª SECCION	ADMINISTRACION	2023-11-13	2023-12-15	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	1,932.00		3 POBLAD O	1	150	0	0.00
67883/ 0073 353417	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA INDEPENDENCIA / EJIDO DE TABORDA	ADMINISTRACION	2023-10-23	2023-12-13	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	1,932.00		3 POBLAD O	1	170	0	0.00
67884/ 0074 353602	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIFERENTES CALLES / LAUREL 1ª SECCION	ADMINISTRACION	2023-10-23	2023-11-25	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	1,932.00		3 POBLAD O	1	170	0	0.00

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 087 TEMOAYA / FAISMUN
Año de Ejercicio 2023. AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 107,728,588.00 REINTEGRO: \$ 0.00


Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
67885/ 0075 353834	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	196 PAVIMENT ACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES DE LA COMUNIDAD / TLALTENANGO ABAJO	ADMINIST RACION	2023-10-23	2023-12-08	700,000.00	700,000.00	0.00	441,853.13	441,853.13	0.00	02 METRO C UADRAD O	1,000.00		3 POBLAD O	1	170	63	63.12
67886/ 0076 354072	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	196 PAVIMENT ACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES / ZANJA VIEJA	ADMINIST RACION	2023-10-01	2023-11-18	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	900.00		3 POBLAD O	1	170	0	0.00
67887/ 0077 354158	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	196 PAVIMENT ACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO A LOS CORRALES / SAN PEDRO ARRIBA 6ª SECCIÓN	ADMINIST RACION	2023-10-02	2023-11-15	600,000.00	600,000.00	0.00	457,116.55	457,116.55	0.00	02 METRO C UADRAD O	855.00		3 POBLAD O	1	170	76	76.19
67888/ 0078 354193	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION DIRECTA	264 PUENTES	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE, PARAJE LOS GONZÁLEZ SEGUNDA ETAPA. / LA CAÑADA	CONTRAT O	2023-09-01	2023-11-30	950,000.00	950,000.00	0.00	474,807.72	474,807.72	0.00	02 METRO C UADRAD O	155.00		3 POBLAD O	1	350	50	49.98
67889/ 0079 354587	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	186 GUARNICIONE S Y BANQUETAS	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES / JIQUIPILCO EL VIEJO 2ª SECCION	ADMINIST RACION	2023-10-02	2023-11-03	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	240.00		3 POBLAD O	1	195	0	0.00
67894/ 0080 359515	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	186 GUARNICIONE S Y BANQUETAS	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES CIRCUITO LAZARO CÁRDENAS Y RUTA DE LA INDEPENDENCIA / COLONIA LAZARO CARDENAS/SAN DIEGO ALCALA 4a. SECCION	ADMINIST RACION	2023-10-01	2023-11-16	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	461.00		3 POBLAD O	1	195	0	0.00
67895/ 0081 378287	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	186 GUARNICIONE S Y BANQUETAS	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN AV. EJE CENTRAL, CALLE RUTA DE LA INDEPENDENCIA / SAN DIEGO ALCALA 3a. SECCION	ADMINIST RACION	2023-11-01	2023-12-01	400,000.00	400,000.00	0.00	54,988.91	54,988.91	0.00	01 METRO LINEAL	470.00		3 POBLAD O	1	195	13	13.74
67896/ 0082 379797	17 URB	UR URBANIZACIO N	C REHABILIT ACION DIRECTA	280 CANCHAS Y ESPACIOS M ULTIDEPORTI VOS	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO CON MURO DE CONTENCIÓN. / SAN PEDRO ARRIBA 4ª SECCION	CONTRAT O	2023-10-02	2023-11-16	400,000.00	400,000.00	0.00	246,140.77	246,140.77	0.00	02 METRO C UADRAD O	400.00		3 POBLAD O	1	909	82	61.54
67897/ 0083 380287	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	052 MUROS DE CONTENCION	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE MAMPOSTERÍA EN CALLE LA JOYA / ZANJA VIEJA	CONTRAT O	2023-09-11	2023-11-18	300,000.00	300,000.00	0.00	290,467.54	290,467.54	0.00	01 METRO LINEAL	26.50		3 POBLAD O	1	200	96	96.82
67900/ 0084 380531	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	255 DRENAJE PLUVIAL	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL DEL PARAJE CANTA RANA / JIQUIPILCO EL VIEJO CENTRO	ADMINIST RACION	2023-11-06	2023-12-15	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	94.00		3 POBLAD O	1	150	0	0.00
67901/ 0085 382798	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO. / JIQUIPILCO EL VIEJO 3ª SECCION (TIERRA BLANCA)	ADMINIST RACION	2023-10-02	2023-11-03	200,000.00	200,000.00	0.00	87,884.99	87,884.99	0.00	01 METRO LINEAL	93.00		3 POBLAD O	1	150	43	43.94
67902/ 0086 385482	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES / SAN PEDRO ABAJO 2ª SECCION	ADMINIST RACION	2023-11-06	2023-12-15	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	78.00		3 POBLAD O	1	150	0	0.00
67903/ 0087 392726	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PARAJE EL ARENAL Y PARAJE BUENAVISTA. / SAN PEDRO ARRIBA 2ª SECCION	CONTRAT O	2023-10-09	2023-11-22	700,000.00	700,000.00	0.00	699,558.58	699,558.58	0.00	01 METRO LINEAL	110.00		3 POBLAD O	200	99	99.94	



REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 087 TEMOAYA / FAISMUN
Año de Ejercicio 2023. Al 31 DE DICIEMBRE DE 2023
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 107,728,588.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Índice	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
67906/ 0088 393711	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES / BARRIO DE LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA	ADMINISTRACION	2023-11-01	2023-12-01	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	185.00		3 POBLADO	1	150	0	0.00
67907/ 0089 394110	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRINCIPAL Y A UN COSTADO DE LOS CORRALES / SAN PEDRO ARRIBA 6ª SECCIÓN	ADMINISTRACION	2023-10-23	2023-11-29	400,000.00	400,000.00	0.00	105,657.30	105,657.30	0.00	01 METRO LINEAL	375.00		3 POBLADO	1	150	26	26.41
67909/ 0090 395307	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CEDRO LIMÓN Y CALLE AVELLANO / SAN LORENZO OYAMEL 3a. SECCIÓN	ADMINISTRACION	2023-11-01	2023-12-15	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	138.00		3 POBLADO	1	150	0	0.00
67910/ 0091 396364	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO MEDIANTE EMBOVEDADO DE LA CALLE 12 DE OCTUBRE. / SAN ANTONIO DEL PUENTE	CONTRATO	2023-07-21	2023-09-19	850,000.00	850,000.00	0.00	424,999.29	424,999.29	0.00	01 METRO LINEAL	50.00		3 POBLADO	1	1,017	50	50.00
67911/ 0092 397169	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO MEDIANTE EMBOVEDADO DE LA CALLE ESTADO DE MÉXICO / SAN JOSE BUENAVISTA EL GRANDE	CONTRATO	2023-08-09	2023-10-08	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	499,998.89	499,998.89	0.00	01 METRO LINEAL	103.00		3 POBLADO	1	350	50	50.00
67912/ 0093 397345	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO MEDIANTE EMBOVEDADO DEL KINDER HACIA EL COMEDOR COMUNITARIO. / POTHE	CONTRATO	2023-07-21	2023-09-19	850,000.00	850,000.00	0.00	849,998.58	849,998.58	0.00	01 METRO LINEAL	56.50		3 POBLADO	1	250	100	100.00
67914/ 0094 397429	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE REFORMA / TODO EL MUNICIPIO	CONTRATO	2023-09-01	2023-11-30	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	1,749,224.40	1,749,224.40	0.00	01 METRO LINEAL	585.37		3 POBLADO	1	5,000	50	49.98
67915/ 0095 397527	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	255 DRENAJE PLUVIAL	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE REFORMA / TODO EL MUNICIPIO	CONTRATO	2023-09-01	2023-11-30	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	1,499,231.10	1,499,231.10	0.00	01 METRO LINEAL	579.45		3 POBLADO	1	5,000	50	49.97
67916/ 0096 397764	18 VIV	17 ELECTRIFI CACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFI CACION	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE / SAN DIEGO ALCALA 2a. SECCIÓN (CENTRO)	CONTRATO	2023-09-18	2023-10-31	350,000.00	350,000.00	0.00	349,399.68	349,399.68	0.00	17 PIEZA	4.00		3 POBLADO	1	78	99	99.83
67918/ 0097 397862	18 VIV	17 ELECTRIFI CACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFI CACION	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN PARAJE SAN LUCAS / SAN JOSE LAS LOMAS	CONTRATO	2023-08-21	2023-09-20	168,588.00	168,588.00	0.00	168,530.33	168,530.33	0.00	17 PIEZA	2.00		3 POBLADO	1	45	99	99.97
67919/ 0098 397898	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION DIRECTA	011 ALUMBRADO PUBLICO	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS CALLES. / EJIDO DE ALLENDE	CONTRATO	2023-09-01	2023-10-13	400,000.00	400,000.00	0.00	398,781.10	398,781.10	0.00	18 LUMINARIA	32.00		3 POBLADO	1	1,804	99	99.70
67920/ 0099 398995	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CALLE REFORMA / TODO EL MUNICIPIO	CONTRATO	2023-09-01	2023-11-30	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00	1,149,072.06	1,149,072.06	0.00	01 METRO LINEAL	639.32		3 POBLADO	1	5,000	50	49.96
67921/ 0100 399052	15 AYS	AP AGUA POTABLE	B AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA MEDIANTE LÍNEA DE CONDUCCIÓN / JIQUEPILCO EL VIEJO 2ª SECCIÓN	CONTRATO	2023-08-09	2023-09-29	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	104.50		3 POBLADO	1	380	0	0.00
67922/ 0101 399228	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA. / SAN PEDRO ARRIBA 5ª SECCIÓN	CONTRATO	2023-10-10	2023-12-08	1,850,000.00	1,850,000.00	0.00	924,668.45	924,668.45	0.00	01 METRO LINEAL	900.00		3 POBLADO	1	600	50	49.98



REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 087 TEMOAYA / FAISMUN
Año de Ejercicio 2023. AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 107,728,588.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
67940/ 0114 420599	17 URB	UR URBANIZACIO N	Z MEJORAMI ENTO COMPLEMEN TARIOS	285 PARQUES PUBLICOS Y/O PLAZAS	EQUIPAMIENTO DE PARQUE PÚBLICO / EJIDO DE DOLORES	CONTRAT O	2023-11-01	2023-11-30	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	6,500.00		3 POBLAD O	1	2,419	0	0.00
67941/ 0115 420770	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCC ION DIRECTA	280 CANCHAS Y ESPACIOS M ULTIDEPORTI VOS	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO / TLALTENANGUITO	CONTRAT O	2023-11-09	2023-12-12	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	5,000.00		3 POBLAD O	1	200	0	0.00
67942/ 0116 420914	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCC ION COMPLEMEN TARIOS	196 PAVIMENT ACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE BOCANEGRA / SAN PEDRO ABAJO 1ª SECCION	ADMINIST RACION	2023-11-01	2023-12-01	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	175.00		3 POBLAD O	1	90	0	0.00
67943/ 0117 423667	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCC ION COMPLEMEN TARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALLE PRINCIPAL / SAN JOSE COMALCO	CONTRAT O	2023-10-16	2023-11-30	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	3,000.00		3 POBLAD O	1	1,300	0	0.00
67944/ 0118 423803	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCC ION COMPLEMEN TARIOS	196 PAVIMENT ACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE TLILCUEZPALIN CAMINO AL CENTRO / JIQUIPILCO EL VIEJO CENTRO	ADMINIST RACION	2023-10-23	2023-11-15	300,000.00	300,000.00	0.00	249,328.66	249,328.66	0.00	02 METRO C UADRAD O	343.00		3 POBLAD O	1	170	83	63.11
67945/ 0119 423927	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCC ION COMPLEMEN TARIOS	196 PAVIMENT ACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO A LA LOMA / SAN JOSE PATHE	ADMINIST RACION	2023-11-01	2023-12-01	140,000.00	140,000.00	0.00	18,707.71	18,707.71	0.00	02 METRO C UADRAD O	167.00		3 POBLAD O	1	170	13	13.36
67946/ 0120 424320	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCC ION COMPLEMEN TARIOS	196 PAVIMENT ACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICA EN VARIAS CALLES / MAGDALENA TENEXPAN 3ª Y 4ª SECCION	ADMINIST RACION	2023-11-06	2023-12-15	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	845,314.72	845,314.72	0.00	02 METRO C UADRAD O	1,600.00		3 POBLAD O	1	150	76	76.85
67947/ 0121 424001	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCC ION COMPLEMEN TARIOS	196 PAVIMENT ACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LUIS CABRERA / SAN PEDRO ABAJO 1ª SECCION	ADMINIST RACION	2023-11-01	2023-12-01	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	252.00		3 POBLAD O	1	170	0	0.00
67948/ 0122 424517	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCC ION COMPLEMEN TARIOS	186 GUARNICIONE S Y BANQUETAS	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN AVENIDA DEL PANTEÓN Y CALLE CAMINO REAL / SAN DIEGO ALCALA 1a. SECCION	CONTRAT O	2023-11-01	2023-12-15	800,000.00	800,000.00	0.00	399,907.45	399,907.45	0.00	01 METRO LINEAL	584.20		3 POBLAD O	1	80	48	48.99
67949/ 0123 424887	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCC ION COMPLEMEN TARIOS	300 ANDADOR URBANO Y/O ESCALINATA	CONSTRUCCION DE ANDADOR PUBLICO O ESCALINATA AL EDAYO / TLALTENANGO ARRIBA	CONTRAT O	2023-10-30	2023-12-08	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	40.00		3 POBLAD O	1	300	0	0.00
67950/ 0124 425044	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCC ION DIRECTA	202 PREESCOLAR (AULAS)	CONSTRUCCIÓN DE PREESCOLAR U HOMOLOGO, AULA Y SANITARIOS EN ESCUELA DE EDUCACION INICIAL / SAN LORENZO OYAMEL 1a. SECCION	CONTRAT O	2023-11-09	2023-12-12	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	16.00		5 ALUMNO	1	80	0	0.00
67951/ 0125 425225	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCC ION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO / CABACERA MUNICIPAL DE TEMOAYA	CONTRAT O	2023-10-09	2023-11-22	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	1,198,200.32	1,198,200.32	0.00	02 METRO C UADRAD O	240.00		5 ALUMNO	1	1,200	99	99.85
67952/ 0126 425360	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCC ION DIRECTA	207 PREPARATORI A (AULAS)	CONSTRUCCIÓN DE AULA PARA LABORATORIO EN ESCUELA PREPARATORIA DE NUEVA CREACIÓN / ENTHAVI CENTRO	CONTRAT O	2023-11-01	2023-12-15	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	849,592.63	849,592.63	0.00	02 METRO C UADRAD O	102.00		5 ALUMNO	1	65	49	49.98



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO




ESTADO DE
MÉXICO
¡El poder de servir!

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 087 TEMOAYA / FAISMUN
Año de Ejercicio 2023. AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 107,728,588.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Inf. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Inf. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
67953/ 0127 425583	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN A LA RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN PARAJE LANCERO UNO Y LANCERO DOS DE LAUREL 1A SECCIÓN / COLONIA CENTRO CEREMONIAL OTOMI	CONTRAT O	2023-09-12	2023-10-11	250,000.00	250,000.00	0.00	249,999.99	249,999.99	0.00	01 METRO LINEAL	120.00		3 POBLAD O	1	900	99	100.00
67954/ 0128 425773	15 AYS	AP AGUA POTABLE	B AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN VARIAS CALLES. / SAN ANTONIO DEL PUENTE	CONTRAT O	2023-11-01	2023-11-30	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	140.00		3 POBLAD O	1	1,017	0	0.00
67955/ 0129 425883	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA. / SAN PEDRO ARRIBA 1ª SECCION	CONTRAT O	2023-11-01	2023-12-15	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	749,914.18	749,914.18	0.00	01 METRO LINEAL	360.00		3 POBLAD O	1	1,150	49	49.99
67956/ 0130 426105	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA. / SAN LORENZO OYAMEL 2a. SECCION	CONTRAT O	2023-10-16	2023-12-11	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	728.00		3 POBLAD O	1	628	0	0.00
67957/ 0131 426505	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CAMINO A PATHE / COLONIA MORELOS	CONTRAT O	2023-11-01	2023-12-01	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	239.00		3 POBLAD O	1	150	0	0.00
67958/ 0132 426592	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	255 DRENAJE PLUVIAL	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN PARAJE DE LA SECUNDARIA / SAN PEDRO ARRIBA 3ª SECCION	ADMINIST RACION	2023-11-06	2023-12-15	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	4.00		3 POBLAD O	1	150	0	0.00
67960/ 0133 426793	18 VIV	MV MEJORAMIENT O DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	220 SANITARIOS CON BIODIGE STORES	EQUIPAMIENTO DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA VIVIENDAS, EN VARIOS PARAJES / COLONIA CENTRO CEREMONIAL OTOMI	CONTRAT O	2023-11-01	2023-12-15	800,000.00	800,000.00	0.00	698,565.44	698,565.44	0.00	17 PIEZA	12.00		3 POBLAD O	1	60	87	87.32
67961/ 0134 427060	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION DIRECTA	174 COMEDORES COMUNITARIO S	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO 1A ETAPA / COLONIA LAZARO CARDENAS/SAN DIEGO ALCALA 4a. SECCION	CONTRAT O	2023-11-01	2023-12-15	450,000.00	450,000.00	0.00	224,701.48	224,701.48	0.00	02 METRO C UADRAD O	133.00		3 POBLAD O	1	260	49	49.93
67962/ 0135 427261	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	281 CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO / COLONIA MORELOS	CONTRAT O	2023-11-01	2023-12-15	800,000.00	800,000.00	0.00	399,670.44	399,670.44	0.00	02 METRO C UADRAD O	52.00		3 POBLAD O	1	300	49	49.96
67964/ 0136 427585	18 VIV	17 ELECTRIFI CACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFI CACION	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN VARIAS CALLES / CALLE REAL	CONTRAT O	2023-10-15	2023-11-30	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	9.00		3 POBLAD O	1	300	0	0.00
67967/ 0137 427831	18 VIV	17 ELECTRIFI CACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFI CACION	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE LAS TORRES / MOLINO ABAJO	CONTRAT O	2023-11-08	2023-12-09	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	5.00		3 POBLAD O	1	80	0	0.00
67968/ 0138 428044	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION DIRECTA	011 ALUMBRADO PUBLICO	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE 1 DE MAYO, CALLE 18 DE MARZO y CALLE 10 DE SEPTIEMBRE / LOMA DE SAN NICOLAS	CONTRAT O	2023-10-09	2023-11-30	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18 METRO C UADRAD O	28.00		3 POBLAD O	1	1,400	0	0.00
67969/ 0139 428289	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	215 PRIMARIA (SANITARIOS)	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA" / LOMA DE SAN NICOLAS	CONTRAT O	2023-10-15	2023-11-30	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12 PIEZA	1.00		5 ALUMNO	1	220	0	0.00
67970/ 0140 428503	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	Z MEJORAMI ENTO DIRECTA	202 PREESCOLAR (AULAS)	REHABILITACIÓN DE AULAS EN ESCUELA PREESCOLAR JAIME TORRES BODET / SAN PEDRO ABAJO 1ª SECCION	CONTRAT O	2023-12-01	2023-12-22	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 METRO C UADRAD O	180.00		5 ALUMNO	1	80	0	0.00

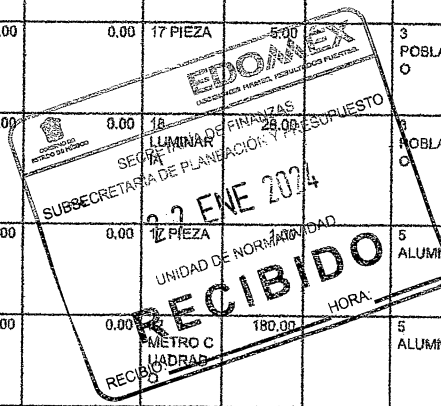



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
¡El poder de servir!

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 087 TEMOAYA / FAISMUN
Año de Ejercicio 2023. AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 107,728,588.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
67971/ 0141 428555	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	255 DRENAJE PLUVIAL	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL / MOLINO ABAJO	CONTRATO	2023-10-23	2023-12-08	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	499,551.90	499,551.90	0.00	01 METRO LINEAL	89.00		3 POBLADO	1	80	49	49.96
67975/ 0142 402985	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	179 DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE. / SAN PEDRO ARRIBA 3ª SECCION	CONTRATO	2023-11-01	2023-12-15	500,000.00	500,000.00	0.00	249,434.50	249,434.50	0.00	03 METRO CUBICO	70.00		3 POBLADO	1	850	49	49.89
67979/ 0143 418315	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION DIRECTA	280 CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS	EQUIPAMIENTO DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EL OCOTAL / JIQUIPILCO EL VIEJO 1ª SECCION	CONTRATO	2023-10-15	2023-11-30	500,000.00	500,000.00	0.00	249,710.30	249,710.30	0.00	02 METRO CUADRADOS	55.00		3 POBLADO	1	500	49	49.94
67980/ 0144 424729	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	052 MUROS DE CONTENCION	EQUIPAMIENTO DE MURO DE CONTENCION EN CALLE LAS FLORES / JIQUIPILCO EL VIEJO 3ª SECCION (TIERRA BLANCA)	CONTRATO	2023-10-15	2023-11-30	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	12.00		3 POBLADO	1	250	0	0.00
68486/ 0145 377255	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE BELIZARIO DOMÍNGUEZ / TLALTENANGO ABAJO	CONTRATO	2023-10-30	2023-12-08	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADOS	195.00		3 POBLADO	1	220	0	0.00
68487/ 0146 419028	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION DIRECTA	280 CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS	CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO / SAN JOSE COMALCO	CONTRATO	2023-11-18	2023-12-28	800,000.00	800,000.00	0.00	399,946.40	399,946.40	0.00	02 METRO CUADRADOS	718.00		3 POBLADO	1	450	49	49.99

TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 146							TOTAL		107,728,588.00	107,728,588.00	0.00	63,148,545.09	63,148,545.09	0.00								5187
---	--	--	--	--	--	--	-------	--	----------------	----------------	------	---------------	---------------	------	--	--	--	--	--	--	--	------

Complementarios: 81	Directa: 65
---------------------	-------------

